

Afbakening basistakenpakket

Plan van aanpak
2 november 2018



Omgevingsdienst
Groningen

Aanleiding

DB besluit (20–9)

- Eenduidige afbakening basistaken ontbreekt tot nu toe.
- Noodzaak om hier invulling aan te geven neemt toe.
 - Heldere afspraken over de uitvoering
 - Wettelijk kader: Bor
 - Relatie inzet ODG en deelnemersbijdrage
 - Wens tot nieuwe financieringstructuur





Omgevingsdienst
Groningen

Doelstelling

Doel project:

- Besluit over afbakening tussen basis- en milieutakenpakket. Basis voor nieuwe financieringsafspraken.




Wat is er al afgerond?

Kader	Status
Verordening kwaliteit (kwaliteitscriteria 2.1)	Afgerond
Toezicht en handhaving strategie	Afgerond
Borging procescriteria (uitvoeringskader T&H) <ul style="list-style-type: none">• Probleemanalyse• Risicoanalyse• Prioriteiten• Frequentie	Ambtelijk nagenoeg gereed Ambtelijk nagenoeg gereed Vervolgstep ingepland (nog) Geen onderdeel opdracht



Omgevingsdienst
Groningen

Routekaart

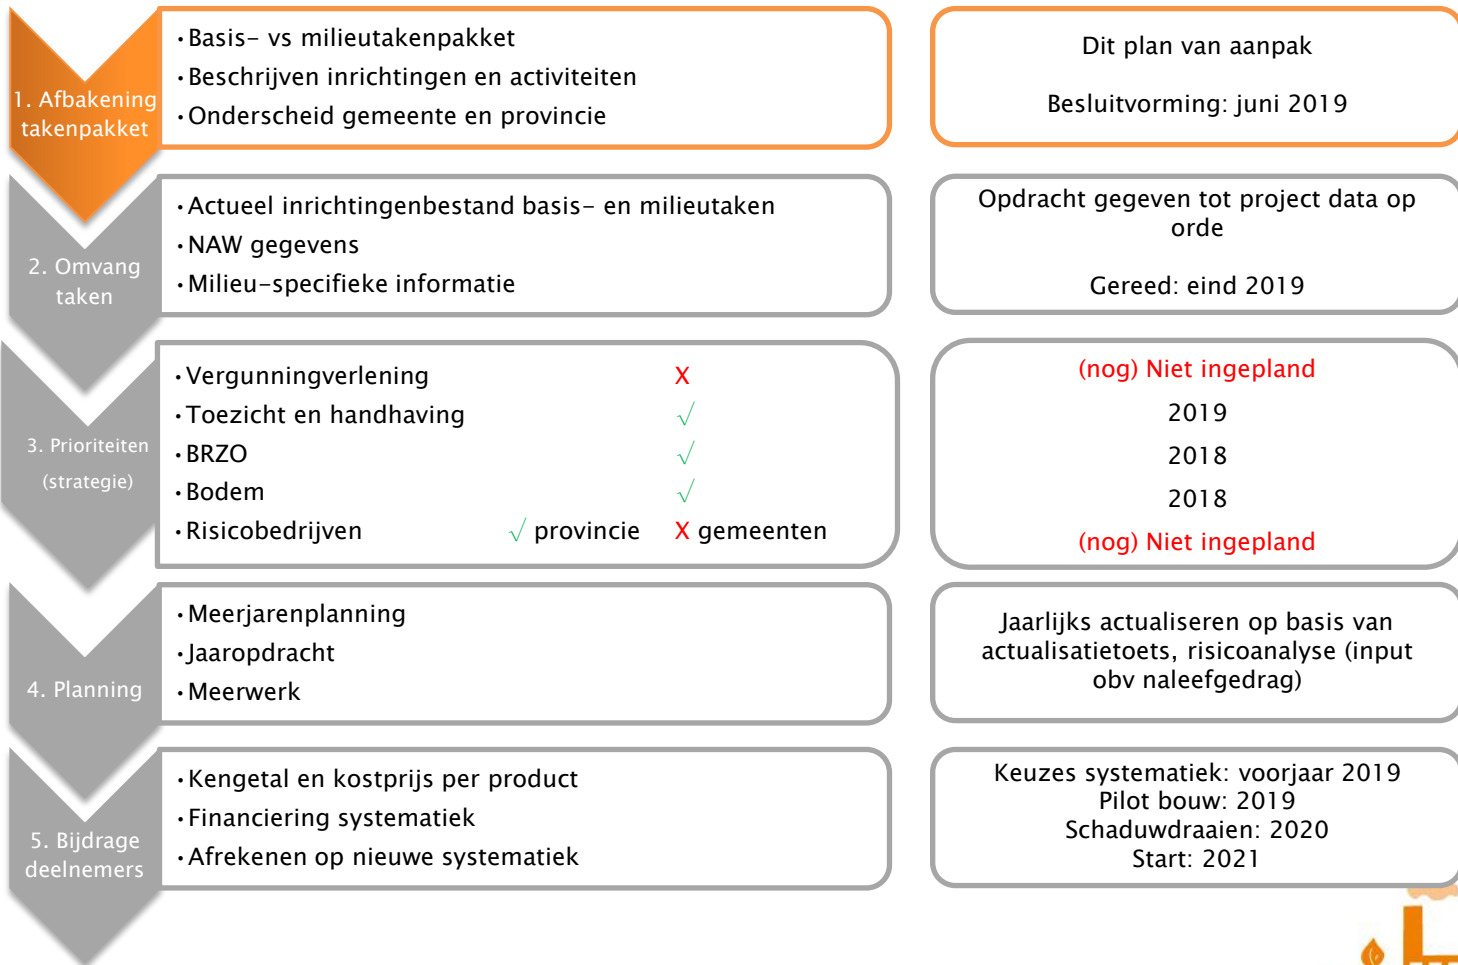


Visie aanpak

1. Het basistakenpakket (BTP) en het milieutakenpakket (MTP) zijn voor de inrichtingen communicerende vaten.
2. Het Bor biedt handvaten voor de basistaken en daarmee voor het BTP.
3. Zicht op de impact van scenario's is voorwaarde voor goede besluitvorming
4. Gezamenlijke proces met afstemming succesvoorwaarde



Omgevingsdienst
Groningen

Stappenplan



Uitwerking

- Werkgroep, bestaande uit deelnemers en ODG
- ODG: Evert (trekker), Paul, Anton, input deelnemers procescriteria
- Deelnemers: René (Groningen), Teun (Westerkwartier), Marco (Provincie), Ralph (Midden-Groningen)

Afstemming

- Via opdrachtgeverslijn: VTH-platform
- DB en AB
- Raden en staten bijpraten via themabijeenkomst





Omgevingsdienst
Groningen

Stap 1: kaders in beeld

Ingrediënten	<ul style="list-style-type: none">• Bor• Packagedeal• Analyse Twente• Verkenning uitgevoerd door enkele basistaakgemeenten
Resultaat	<p>Basistakenpakket en milieutakenpakket Aanbrengen driedeling activiteiten en inrichtingen</p> <p>Wettelijk][Interpretatie wet][Praktijk</p>
Hoe?	<ol style="list-style-type: none">1. 2 werksessies werkgroep2. Voorbereiding: Paul, met inbreng specialisten en Bert Kupers (Oldambt)



Bundelt kennis & ervaring



Omgevingsdienst
Groningen

Stap 2: scenario's

Ingrediënten	<ul style="list-style-type: none">• Kaders in beeld• Voorstel ministerie+ reacties Omgevingswet
Resultaat	<p>Beschrijven en uitwerken 3 scenario's, gedacht wordt aan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wettelijke basistaken2. Ruim basistakenpakket3. Aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen
Hoe?	<ol style="list-style-type: none">1. Eén of twee werksessies werkgroep2. Voorbereiding: opzet werksessie (interactief)



Stap 3: impactanalyse

Ingrediënten	<ul style="list-style-type: none">• Kaders in beeld en scenario's• Huidige inbreng
Resultaat	<p>Analyse impact drie scenario's voor individuele deelnemers en ODG</p> <ul style="list-style-type: none">• Inbreng taken• Formatie / budget• Bijdrage aan realisatie VTH doelen (o.a. veilige leefomgeving, level playing field, kwaliteit dienstverlening)
Hoe?	<ol style="list-style-type: none">1. Format opstellen: werkgroep2. Voorinvullen format: accountmanagement + specialisten ODG op basis van o.a. jaaropdracht3. Toetsen/ aanscherpen ingevulde gegevens: regisseurs



Omgevingsdienst
Groningen

Stap 4: rapportage

Ingrediënten	<ul style="list-style-type: none">• Kaders in beeld• Scenario's• Impactanalyse
Resultaat	Rapportage waarin het resultaat van de voorgaande stappen in samenhang is beschreven, inclusief vervolgstappen.
Hoe?	<ol style="list-style-type: none">1. Voorbereiding: opstellen rapportage Evert en Paul2. Werkgroep: aanscherpen en aanvullen



Besluitvorming

Algemeen bestuur

1. Juni 2019: vaststellen rapportage, toetsen of er draagvlak voor besluitvorming is
2. September / oktober 2019: besluit scenario en vervolgstappen
